

Atividades de Extensão I · Semana 6

Atividades de Extensão I

Semana 6 — Cronograma do projeto e distribuição de responsabilidades

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Etapas: 2 — Planejamento

Encontros: 1 e 2

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais

Objetivos da Semana

Ao final da semana, vocês devem conseguir:

- traduzir objetivos e público-alvo (Semana 5) em um **cronograma de projeto** com etapas, prazos e marcos;
- verificar a compatibilidade do cronograma com o Cronograma da disciplina;
- identificar funções necessárias ao projeto e **atribuí-las nominalmente**;
- **entregar**, em equipe, cronograma e responsabilidades definidos.

Por que isso importa para o projeto


- Objetivos e público-alvo já estão definidos — agora é hora de estruturar **como e quando**
- Cronograma e papéis sustentam a Semana 7 (logística, recursos, acessibilidade, segurança)
- Sem isso, a Preparação (Semanas 8–11) começa sem direção e sobrecarrega poucas pessoas



DICA

Um cronograma realista hoje evita retrabalho na Semana 7 e atropelos na Preparação.

Do planejamento à execução

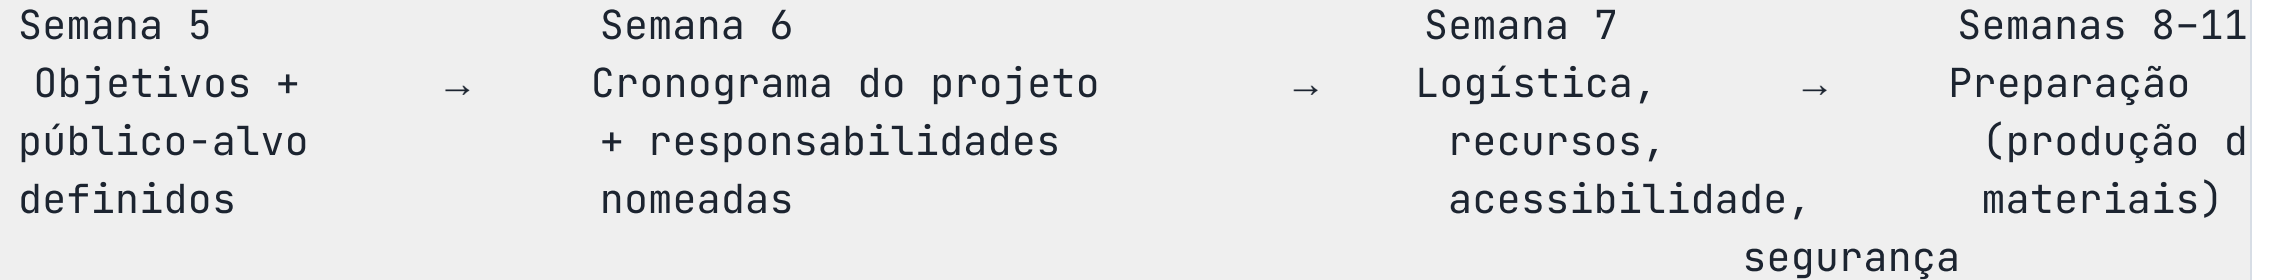

Cronograma macro × cronograma do projeto

	Cronograma da disciplina	Cronograma do projeto
O quê	Semanas e entregas da disciplina	Etapas específicas da equipe
Quem define	Já está fixo (Cronograma_Extensao.md)	A própria equipe
Função hoje	Limite e referência de prazos	Documento a ser produzido

DICA

O cronograma da equipe deve **caber dentro** dos marcos já fixados da disciplina, não o contrário.

Elementos de um cronograma de projeto

- **Etapas** — preparação, execução, documentação, avaliação
- **Marcos** — pontos de verificação com resultado concreto
- **Prazos** — datas ou semanas-limite para cada etapa
- **Responsáveis** — quem executa e quem acompanha

Marcos que o cronograma precisa respeitar

- **Semana 7** — plano completo do projeto (entrega)
- **Semana 11** — projeto pronto para execução (entrega)
- **Semana 12** — início da execução
- **Semana 15** — execução encerrada, evidências organizadas

CURIOSIDADE

Esses marcos vêm do Cronograma da disciplina — não são negociáveis. O que se ajusta são os prazos internos da equipe.

Exemplo preenchido (oficina de jogos)

Etapa	Prazo	Marco	Responsável
Definir conteúdo da oficina	Semana 8	Roteiro aprovado	Ana
Produzir material de apoio	Semanas 9–10	Material pronto	Bruno
Divulgar oficina	Semana 10	Inscrições abertas	Carla
Testar atividade	Semana 11	Ensaio geral feito	Equipe

Riscos comuns em cronogramas de projeto

- prazos otimistas demais, sem folga para ajustes;
- etapas dependentes umas das outras sem essa dependência registrada;
- tudo concentrado nas últimas semanas antes da Execução;
- cronograma detalhado demais, difícil de acompanhar.

DICA

Simplicidade é melhor que burocracia: etapas, prazos e responsáveis já são suficientes.

Funções comuns em projetos de extensão

- **Coordenação** — acompanha o todo, resolve impasses
- **Comunicação** — fala com parceiros, público e divulgação
- **Documentação** — registra decisões e evidências
- **Logística** — organiza espaço, materiais, recursos
- **Desenvolvimento técnico** — produz o que o projeto exige
- **Relacionamento com parceiros** — mantém contato externo

CURIOSIDADE

Nem todo projeto precisa de todas as funções — depende da modalidade escolhida.

O que caracteriza uma boa distribuição

- cada tarefa do cronograma tem **um nome** associado, não "a equipe";
- carga de trabalho **equilibrada** entre os integrantes;
- ninguém acumula funções demais sozinho;
- cada integrante sabe exatamente o que é sua responsabilidade.

Exemplos (diferentes modalidades)

Modalidade	Marcos típicos	Funções em destaque
Evento	Espaço reservado, convidados confirmados, divulgação pronta	Logística, comunicação
Jogo para escola parceira	Protótipo, testes internos, testes na escola, versão final	Desenvolvimento técnico, relacionamento com parceiros
Serviço tecnológico	Diagnóstico, execução, repasse ao parceiro	Coordenação, relacionamento com parceiros

Atividade da Semana

- **Encontro 1:** mini aula sobre cronograma de projeto → equipe elabora as etapas e prazos até a Execução
- **Encontro 2:** mini aula sobre funções e responsabilidades → equipe atribui nominalmente cada tarefa e verifica compatibilidade com o Cronograma da disciplina

Consolidação final em documento único da equipe.



Checkpoint da Semana

OBJETIVOS

- O cronograma cobre todas as etapas até a Execução, com prazos realistas?
- Está compatível com os marcos da disciplina (Semanas 7, 11, 15)?
- As responsabilidades foram atribuídas nominalmente, ou seguem genéricas?
- A distribuição de tarefas está equilibrada entre os integrantes?
- Existe algum impedimento já identificado?

Próximos Passos

Até o próximo encontro, cada equipe deve:

- revisar o cronograma e a distribuição de responsabilidades após um dia;
- pedir que cada responsável confirme, por mensagem à equipe, ciência e concordância com sua atribuição.

Semana 7: **logística, recursos, acessibilidade e segurança** — fechamento do Plano Completo do Projeto.

Encerramento

- Hoje a equipe estruturou **quando** e **quem** faz o quê no projeto
- Cronograma e papéis definidos sustentam toda a Preparação (Semanas 8–11)
- Responsabilidade nomeada e prazo realista evitam sobrecarga e atropelos mais adiante

✓ BOAS PRÁTICAS

Cronograma claro e papéis nomeados hoje tornam a Semana 7 — e toda a Preparação — muito mais tranquila.
